


ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1

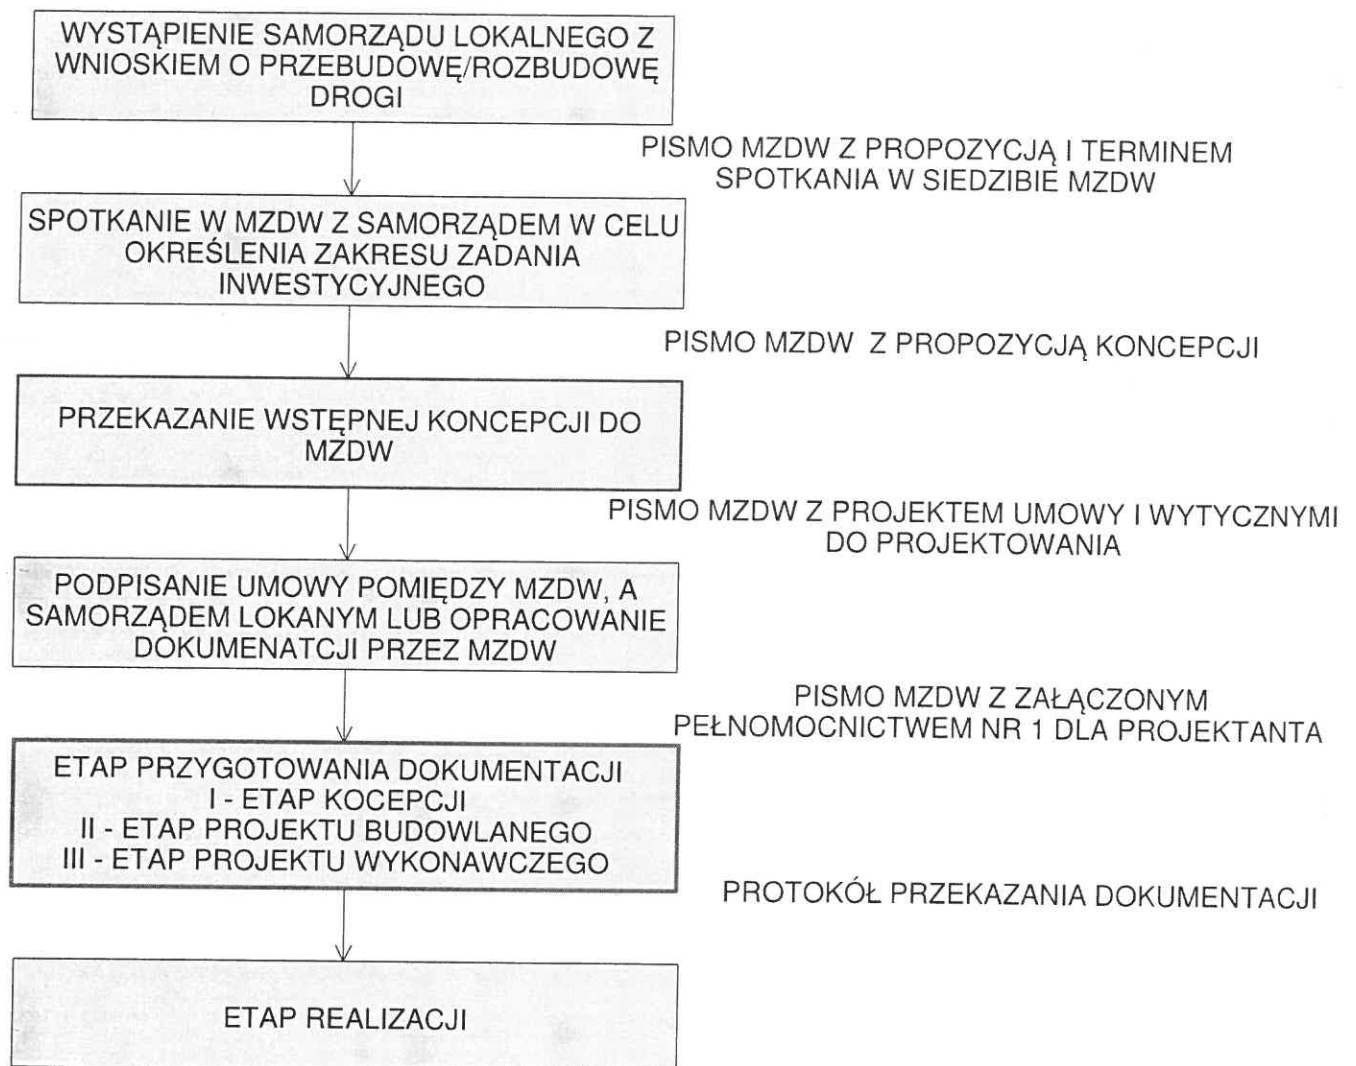

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY
MZDW I SAMORZĄDEM LUB MZDW I BIUREM PROJEKTOWYM
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
ETAP 1 - KONCEPCJA

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCTWA CZASOWEGO
NR 1 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA
WSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

WSTĘPNE OPRACOWANIE MAPY DO CELÓW
PROJEKTOWYCH ZGODNIE Z SIWZ

PRZYGOTOWANIE WSTĘPNYCH MATERIAŁÓW

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW -
MZDW ORGANIZUJE SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z
DEPARTAMENTEM
WYSTĘPNE OKREŚLENIE ZAKRESU PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY
DROGI
TERMIN - 2 MIESIĄCE OD PODPISANIA UMOWY

OPRACOWANIE KONCEPCJI
PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DROGI

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW
SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z MZDW I DEPARTAMENTEM

SPOTKANIE KOORDYNACYJNE Z PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
SAMORZĄDU LUB BIUREM PROJEKTOWYM MZDW

ZAKOŃCZENIE ETAPU I
- KONCEPCJA 4 MIESIĄCE OD PODPISANIA
UMOWY

wymagane przez MZDW

data uzyskania

wymagane przez MZDW

data uzyskania

KONCEPCJA NR 1
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI
- BEZ UZYSKIWANIA ODDSTĘPSTW

KONCEPCJA NR 2
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
MOŻLIWE UZYSKIWANIE ODDSTĘPSTW
- WARIANT PREFEROWANY

KONCEPCJA NR 3
OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - MOŻLIWE
UZYSKIWANIE ODDSTĘPSTW
- WARIANT DODATKOWY NP - W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SKRZYŻOWAŃ

proponowana
data uzyskania/
data uzyskania

wymagane
przez MZDW

- zakupienie mapy zasadniczej
- wypisy i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydane przez właściwy organ
- informacje na temat stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, wymagających podjęć działań zmierzających do regulacji stanu prawnego zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
- informacje na temat klasy i kategorii dróg włączających się do projektowanej drogi wojewódzkiej
- informacje na temat obiektów objętych ochroną występujących w rejonie projektowanej drogi
- wstępne warunki zarządców dróg, kolei i cieków powiązanych z projektowaną drogą wojewódzką
- wniośki samorządów lokalnych oraz właściwych instytucji, których stanowisko jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy
- dokumentacja fotograficzna
- inventaryzacja istniejącego oznakowania
- inventaryzacja zieleni w pasie drogowym
- uzyskanie informacji z Rejonu Drogowego na temat przeglądów obiektów mostowych i przepustów drogowych - kopia przeglądu, wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektów.
- pomiar natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniach w obrębie inwestycji
- uzyskanie kopii decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym
- uzyskanie kopii decyzji na lokalizowanie zjazdów publicznych i indywidualnych
- inventaryzacja zjazdów istniejących z podziałem na zjazdy publiczne i indywidualne
- pobranie wypisów uproszczonych dla działek sąsiadujących z działkami drogowymi
- wstępne określenie sposobu odprowadzenia wód z pasa drogowego
- określenie stanu technicznego infrastruktury niezwiązanej z drogą
- określenie lokalizacji odwiertów badań geologicznych
- wykonanie kamerowania istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej


data uzyskania

- aktualizacja mapy zasadniczej o pomiaru wysokościowe
- analiza pol widoczności dla każdego wariantu
- wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów dla każdego wariantu
- uzyskanie opinii Departamentu w zakresie geometrii dla wariantów
- uzyskanie opinii Wydziału Inżynierii Ruchu MZDW U-1 w zakresie geometrii dla wariantów

data uzyskania

- przebieg wariantu preferowanego
- wybor trasy uzyskania decyzji administracyjnych, zgłoszenie pozwolenia na budowę, decyzja ZRID

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 3

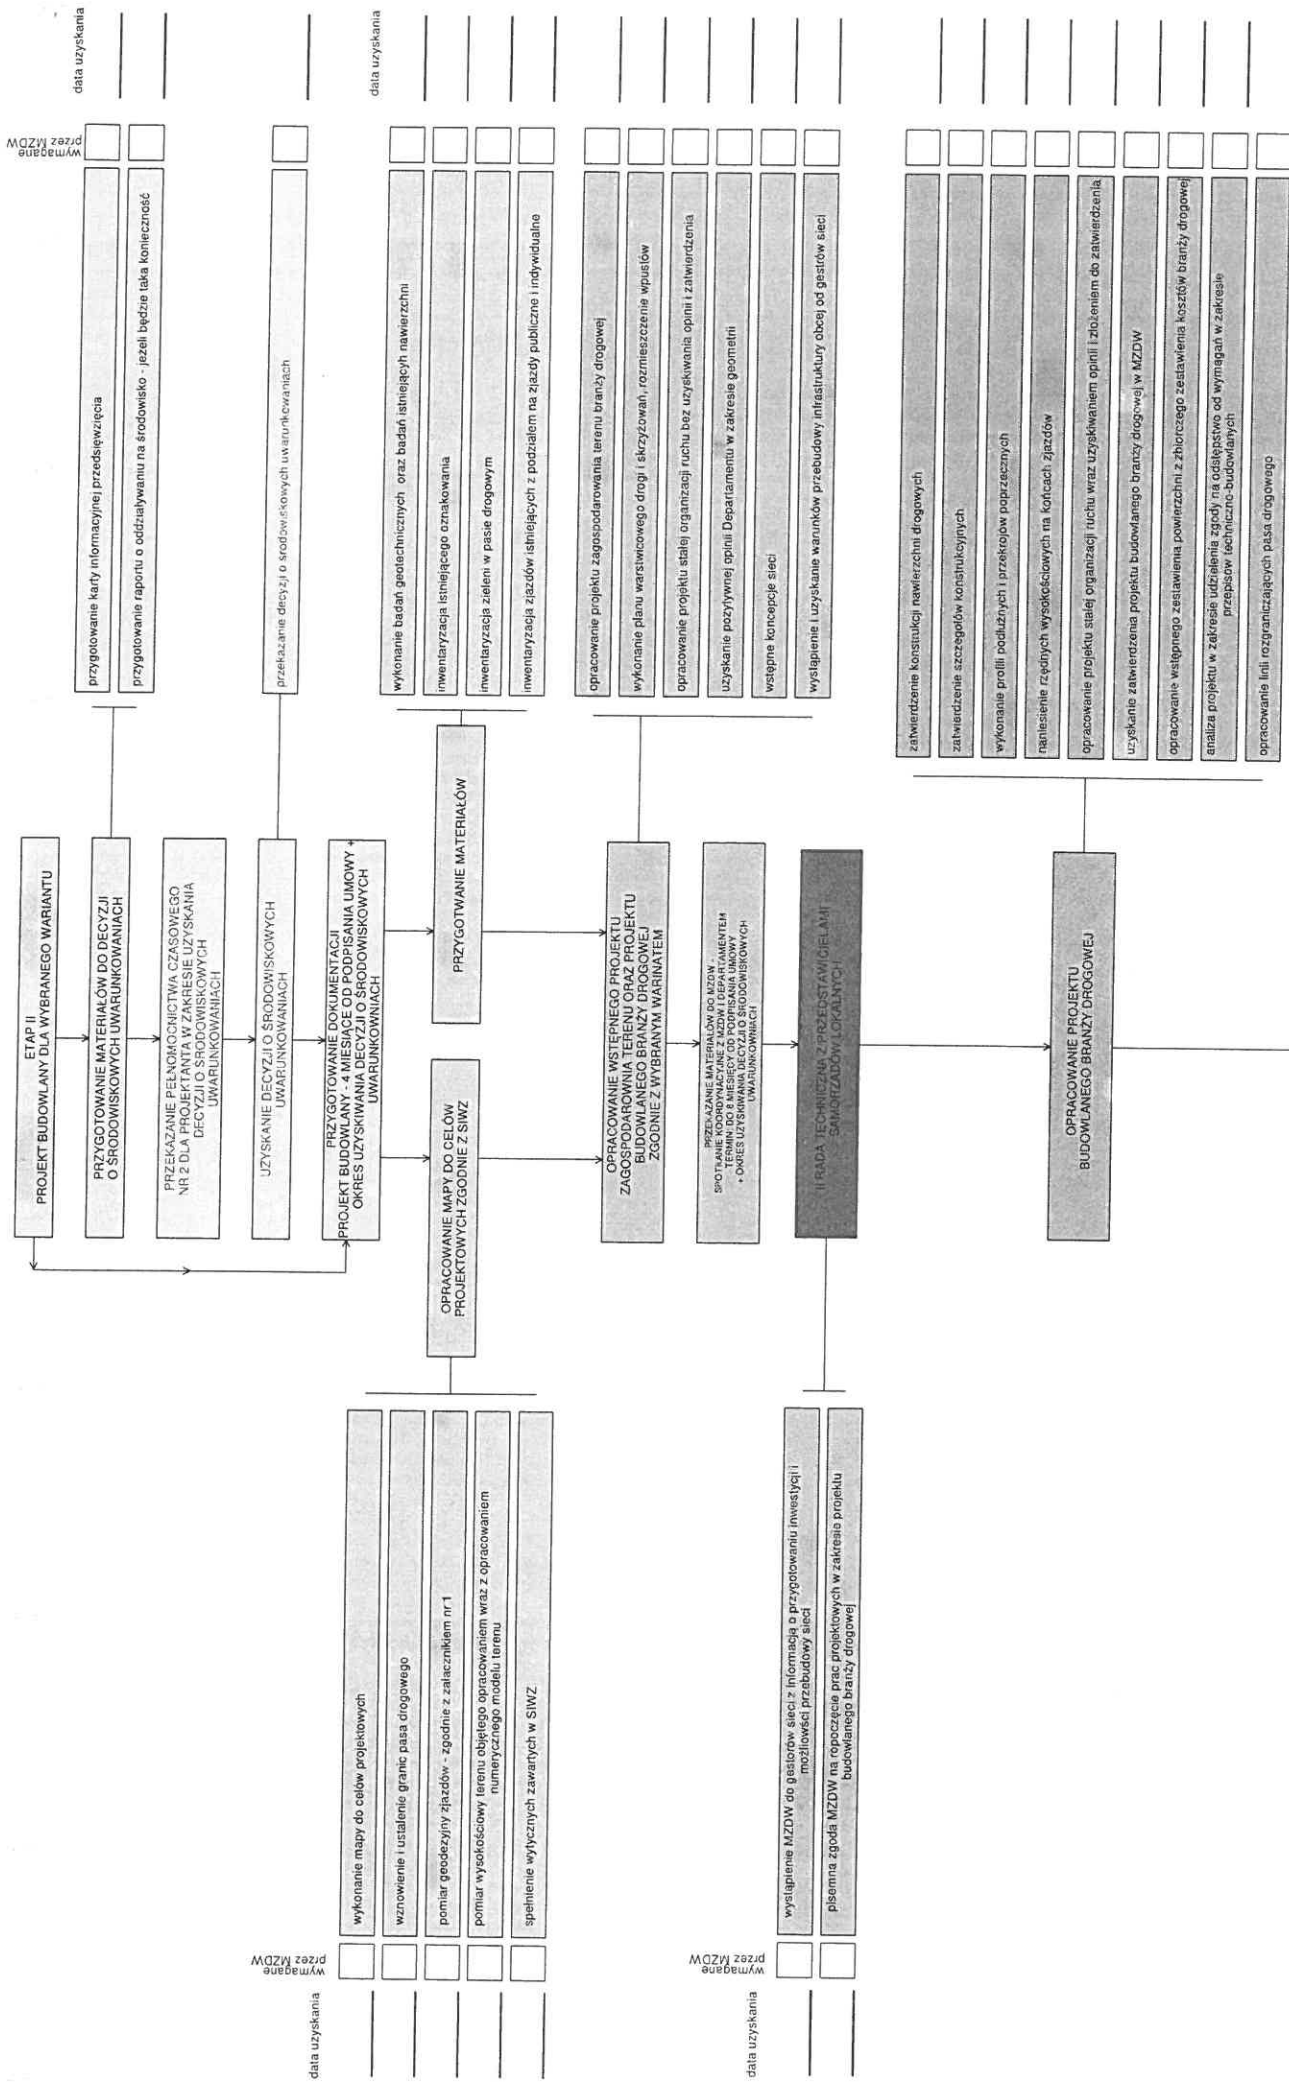

ZALĄCZNIK GRAFICZNY NR 4

Wymagane przez MZDW

.....
 []
 pisemna zgoda MZDW na rozpoczęcie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego innych branż

data przekazania

[]
 PRZEKAZANIE PEŁNOMOCTWA CZASOWEGO NR 3 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA POSTANOWIENIA W ZAKRESIE UDZIELNIA ZGODY NA ODSZTĘPSTWO OD WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPIŚCÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

data uzyskania

[]
 UZYSKANIE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE UDZIELNIA ZGODY NA ODSZTĘPSTWO OD WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPIŚCÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

WSTĘPNE OPRACOWANIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

rejestracja mapy do celów projektowych	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci elektrycznej nN i SN	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci elektrycznej - oświetlenie	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci teletechnicznej	[]
opracowanie koncepcji przebudowy sieci melioracji szczegółowej	[]
wystąpienie o uzgodnienie przebiegu sieci z gęstotami	[]
wydziałanie sieci w zależności od podmiotu finansującego przebudowę	[]
przygotowanie materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	[]
opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów dla każdej branży oddzielnie	[]

data uzyskania

Wymagane przez MZDW

.....
 []
 pisemna zgoda MZDW na kontynuowanie prac projektowych w zakresie projektu budowlanego branż - zgodna na uzyskanie opinii ZUD

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW PO UZNIWNIENIU
 SPOTKANIE KOORDYNUJĄCEJ Z MZDW I DEPARTAMENTEM
 TERMIN: DO 14 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
 + OPIEKA URZĘDNIKÓW MZDW I SPODRODOWISKOWYCH
 UWARUNKOWANIE

UZYSKANIE POZYTYWNEJ OPINII ZUD

data przekazania

[]
 PRZEKAZANIE PEŁNOMOCTWA CZASOWEGO NR 3 DLA PROJEKTANTA W ZAKRESIE UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

data uzyskania

[]
 UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

OPRACOWANIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji - deszczowej	[]
opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej	[]
opracowanie projektu przebudowy sieci elektrycznej nN i SN	[]
opracowanie projektu przebudowy sieci elektrycznej - oświetlenie	[]
opracowanie projektu przebudowy sieci teletechnicznej	[]
opracowanie projektu przebudowy sieci melioracji szczegółowej	[]
opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej branży oddzielnie	[]
podział dokumentacji na tomy zgodne z SIWZ	[]

data uzyskania

ZALĄCZNIK GRAFICZNY NR 5

wymagane przez MZDW
 data zatwierdzenia

zawierzenie linii rozgraniczających pasa drogowego

data uzyskania

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO MZDW
 TERMIN: DO 18 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY
 + OKRES UZYSKIWANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
 UWAGUNKOWNIACH

1 EGZ. PROJEKTU BUDOWLANEGO (PZT+PB)

data uzyskania

OPRACOWANIE MAP PODZIAŁOWYCH NIERUCHOMOŚCI

data uzyskania

OPRACOWANIE ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU ZRID
 UZYSKANIE WYMAGANYCH OPINIÍ

data uzyskania

PRZEKAZANIE PEŁNOMOCCNICTWA CZASOWEGO NR 5
 DLA PROJEKTANTA W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O
 WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ
 INWESTYCJI DROGOWEJ

data uzyskania

UZYSKANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

data uzyskania

ZAKOŃCZENIE ETAPU II
 - PROJEKT BUDOWLANÝ
 TERMIN: DO 24 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY + OKRES UZYSKIWANIA
 EGZ-22 O SRODOWISKOWYCH UWAGUNKOWNIACH

data uzyskania

ETAP III
 - PROJEKT WYKONAWCZY
 TERMIN: DO 28 MIESIĘCY OD PODPISANIA UMOWY + OKRES UZYSKIWANIA
 DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWAGUNKOWNIACH

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 6

SKŁAD PROJEKTU BUDOWLANEGO		Wymagane dokumenty przebieg innow	data uzyskania
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		<input type="checkbox"/>	
TOM I A	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS + RYSUNKI	<input type="checkbox"/>	
TOM I B	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UZGODNIENIA	<input type="checkbox"/>	
TOM I C	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA		<input type="checkbox"/>	
TOM II A	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA	<input type="checkbox"/>	
TOM II B	PROJEKT BUDOWLANY - WZMOCNIENIE PODŁOŻA	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIE		<input type="checkbox"/>	
TOM III A	PROJEKT BUDOWLANY - ODWODNIENIE - BRANŻA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	<input type="checkbox"/>	
TOM III B	PROJEKT BUDOWLANY - ODWODNIENIE - BRANŻA SANITARNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI	<input type="checkbox"/>	
TOM III B	PROJEKT BUDOWLANY - ODWODNIENIE - BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBIÓRKA ROWÓW	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA		<input type="checkbox"/>	
TOM IV A	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA	<input type="checkbox"/>	
TOM IV B	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI SN I NN	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA TELETECHNICZNA		<input type="checkbox"/>	
TOM V	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA TELETECHNICZNA	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ZIELEN		<input type="checkbox"/>	
TOM VI	PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ZIELEN	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI		<input type="checkbox"/>	
TOM VII	PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE GEOTECHNICZNE		<input type="checkbox"/>	
TOM VIII	PROJEKT ARCHITEKTONCZNO BUDOWLANY OPRACOWANIE GEOTECHNICZNE	<input type="checkbox"/>	
PROJEKT BUDOWLANY OBIEKTY INŻYNIERSKIE		<input type="checkbox"/>	
TOM IX A	PROJEKT ARCHITEKTONCZNO BUDOWLANY - OBIEKT.....	<input type="checkbox"/>	
TOM IX B	PROJEKT ARCHITEKTONCZNO BUDOWLANY - OBIEKT.....	<input type="checkbox"/>	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 7

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO		wymagane przez MZDOW	data uzyskania
BRANŻA DROGOWA		<input type="checkbox"/>
TOM I	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA		
BRANŻA SANITARNA		<input type="checkbox"/>
TOM II A	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJA DESZCZOWA		
TOM II B	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA WODOCIĄGU		
TOM II C	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA GAZOCIĄGU		
TOM II D	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		<input type="checkbox"/>
TOM III A	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - BUDOWA OŚWIETLENIA		
TOM III B	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ELEKTRYCZNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA		
BRANŻA TELETECHNICZNA		<input type="checkbox"/>
TOM IV	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA TELETECHNICZNA - ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ		
BRANŻA ZIELEN		<input type="checkbox"/>
TOM V	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA ZIELEN		
INNE BRANŻE		<input type="checkbox"/>
TOM VI	PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA		
STWIOR		<input type="checkbox"/>
	STWIOR BRANŻY DROGOWEJ		
	STWIOR BRANŻY SANITARNEJ		
	STWIOR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
	STWIOR BRANŻY TELETECHNICZNEJ		
	STWIOR BRANŻY ZIELEN		
	STWIOR INNYCH BRANŻ		
KOSZTORYS INWESTORSKI		<input type="checkbox"/>
	KOSZTORYS BRANŻY DROGOWEJ		
	KOSZTORYS BRANŻY SANITARNEJ		
	KOSZTORYS BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
	KOSZTORYS BRANŻY TELETECHNICZNEJ		
	KOSZTORYS BRANŻY ZIELEN		
	KOSZTORYS INNYCH BRANŻ		
PRZEMIAŁ		<input type="checkbox"/>
	PRZEDMIAR BRANŻY DROGOWEJ		
	PRZEDMIAR BRANŻY SANITARNEJ		
	PRZEDMIAR BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
	PRZEDMIAR BRANŻY TELETECHNICZNEJ		
	PRZEDMIAR BRANŻY ZIELEN		
	PRZEDMIAR INNYCH BRANŻ		
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		<input type="checkbox"/>
KONCEPCJA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU		<input type="checkbox"/>
